

За последователността и организацията на отделните етапи на изпълнение на обществена поръчка с предмет: ОБЕКТ: „Инженеринг /инвестиционно проектиране и строителство / на обект : Реконструкция, преустройство, модернизация и въвеждане на енергосп III-За училище, по пла

От : "ТОП ЕНЕРДЖИ" ДЗЗД (име на участника)

№ по ред	Наименование на дейността	брой заети работници	Календарни дни	Начало		месец 1																															месец 2																															месец 3																														
				ден	ден	дни																															дни																															дни																														
1	2	3	4	5	дни																															дни																															дни																															
ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ																																																																																																		
1.1	ЕТАП 1: АРХИТЕКТУРНО ЗАСНЕМАНЕ на сградата, придружено от геодезическо заснемане на терена в целия имот и становища за сградните инсталационни отклонения.	3	15	1-ви	15-ти																																																																																													
1.2	ЕТАП 2: Извършване на КОНСТРУКТИВНО ОБСЛЕДВАНЕ на сградата по безразрушителен метод и изследване за носимоспособност - механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителната конструкция и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания /, с предствяне на доклад за конструктивно обследване и за двете конструктивно независими тела в състава на сградата, с отразяване на техническите характеристики и на предвидени мерки за конструктивно и сеизмично укрепване на СГРАДАТА. / ако се налага такова/.	2	30	1-ви	30-ти																																																																																													
1.3	ЕТАП 3: ИДЕЕН ПРОЕКТ, изработен на база представеното в офертата ИДЕЙНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на участника, избран от Възложителя за ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка и в съответствие с Наредба №4/2001 на МРРБ за обема и съдържанието на инвестиционните проекти. фаза идеен проект.	5	25	31-ви	55-ти																																																																																													
1.4	ЕТАП 4: ПРОЕКТНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ на "НУЛЕВ ЦИКЪЛ"- Изработване на кофражни и армировъчни планове за „нулев цикъл“ до кота ± 0.00, при условие, че е наложително конструктивно и сеизмично укрепване на сградата.	2	15	56-ти	70-ти																																																																																													
1.5	ЕТАП 5: РАБОТЕН ПРОЕКТ, изработен на базата на одобрения от Възложителя Инвестиционен проект във фаза Идеен проект, с доклад за съответствие на инвестиционния проект.	6	45	56-ти	100																																																																																													
П.	АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СМГ и изработване на екзекутивни чертежи за отразяване на несъществени изменения от РП възникнали в процеса на строителството /.																																																																																																	
2.1	УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ОТ ПРОЕКТАНТИТЕ по отделните части на ИП през целия период на строителството на обекта	1		110-ти	211-ти																																																																																													
2.2	ИЗРАБОТВАНЕ НА ЕКЗЕКУТИВНИ ЧЕРТЕЖИ ПО ЧАСТИ/ без част обзавеждане и оборудване/, когато това се налага в процеса на изпълнение на строителството за отразяване на несъществени изменения от РП възникнали в процеса на строителството /.																																																																																																	

месец 4

месец 5

месец 6


месец 7

месец 8

Handwritten signatures and initials

30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---

дни										дни										дни										дни										дни				
-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--

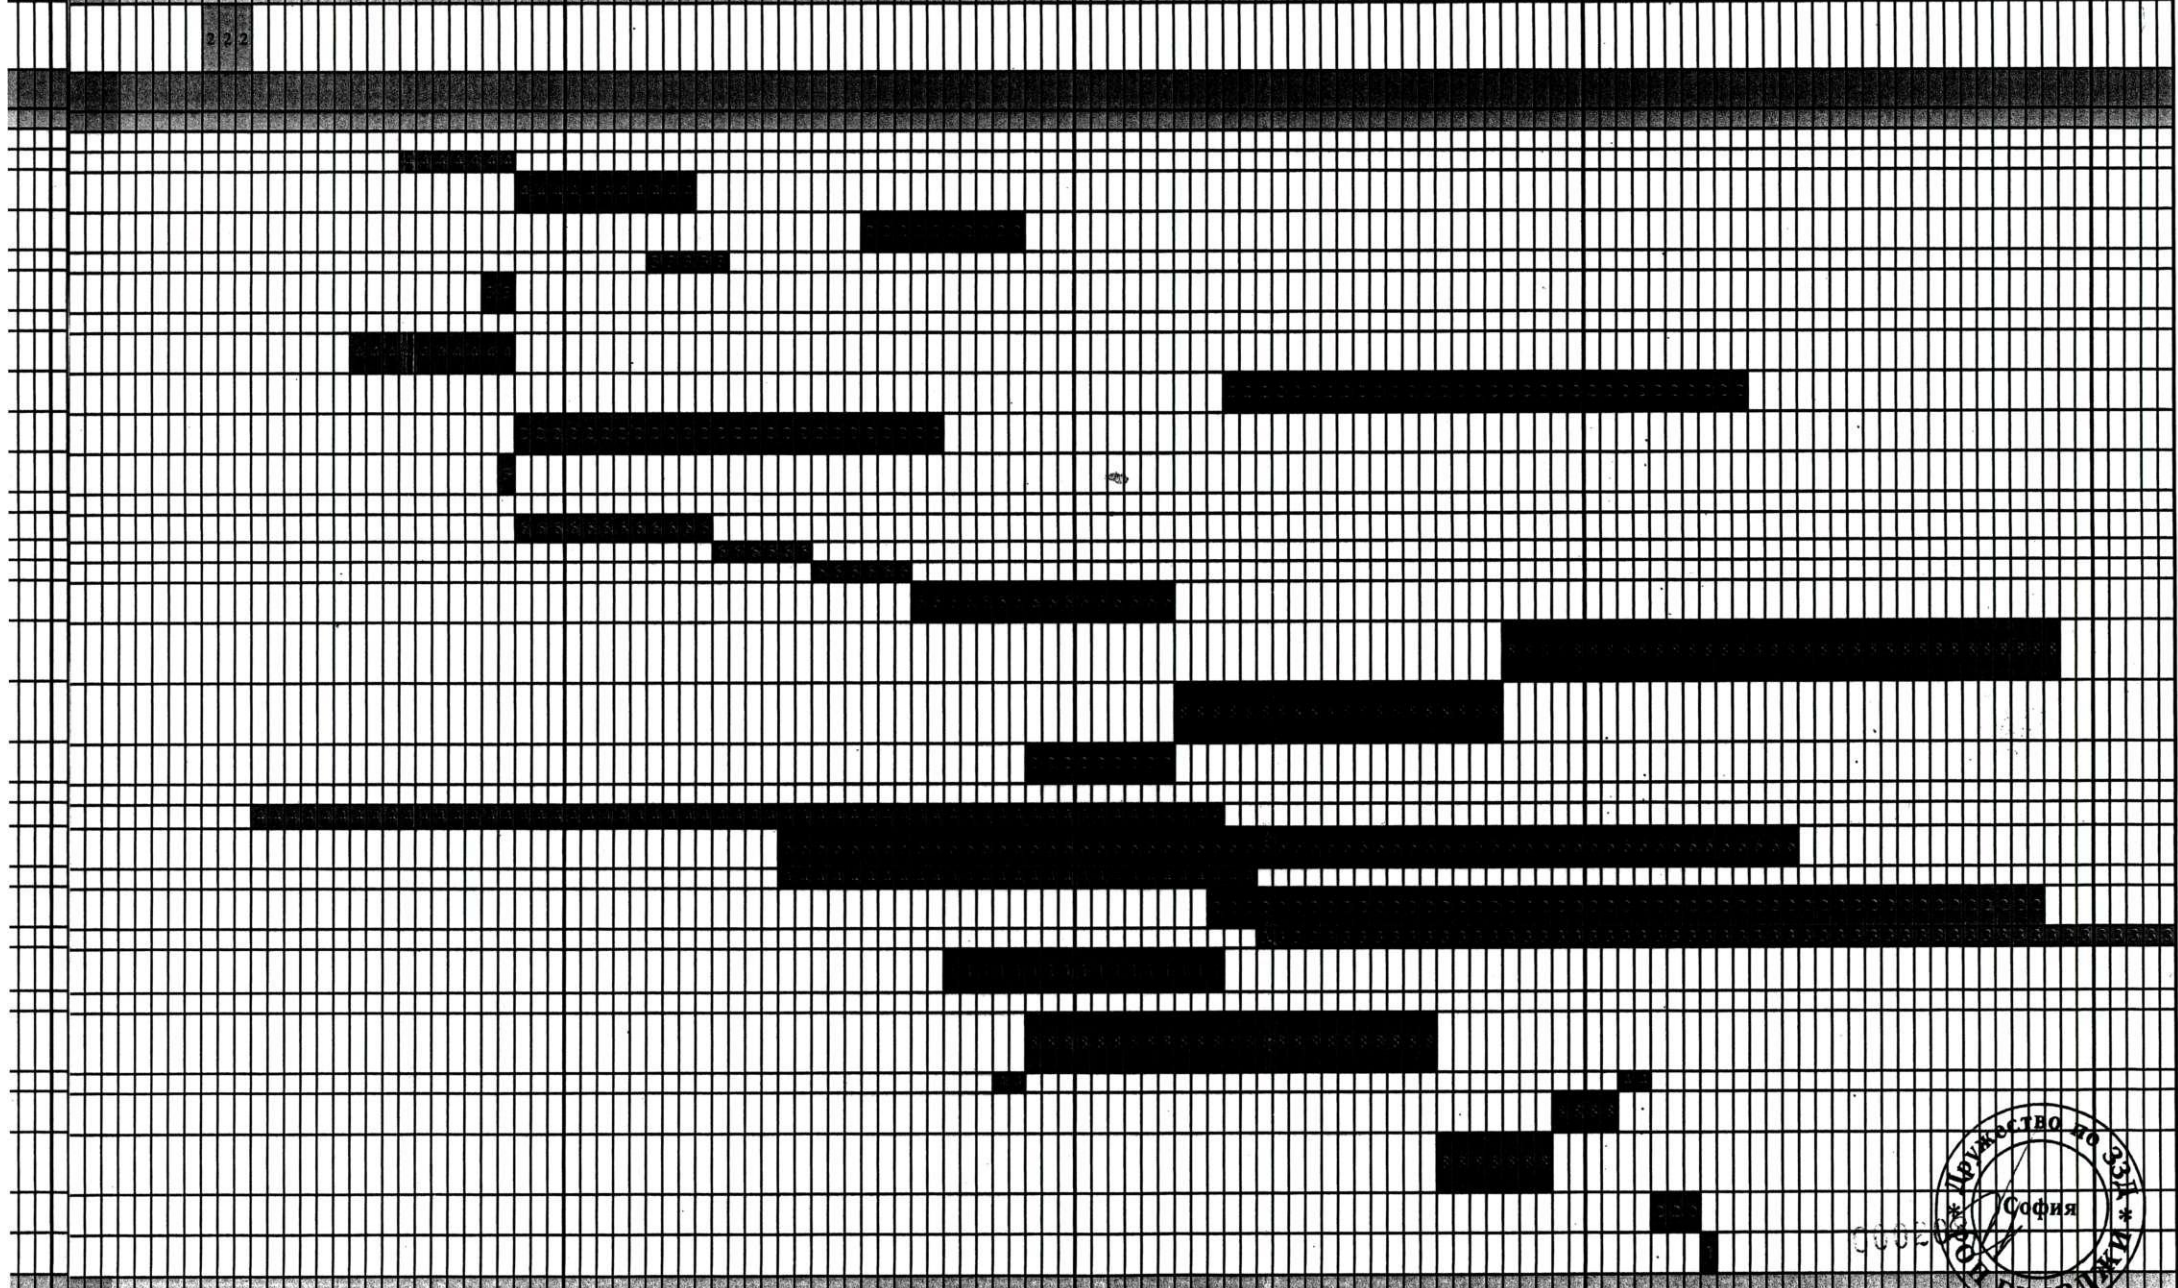

29
 30
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31


Месяц 4

Месяц 5

Месяц 6

Месяц 7

Месяц 8

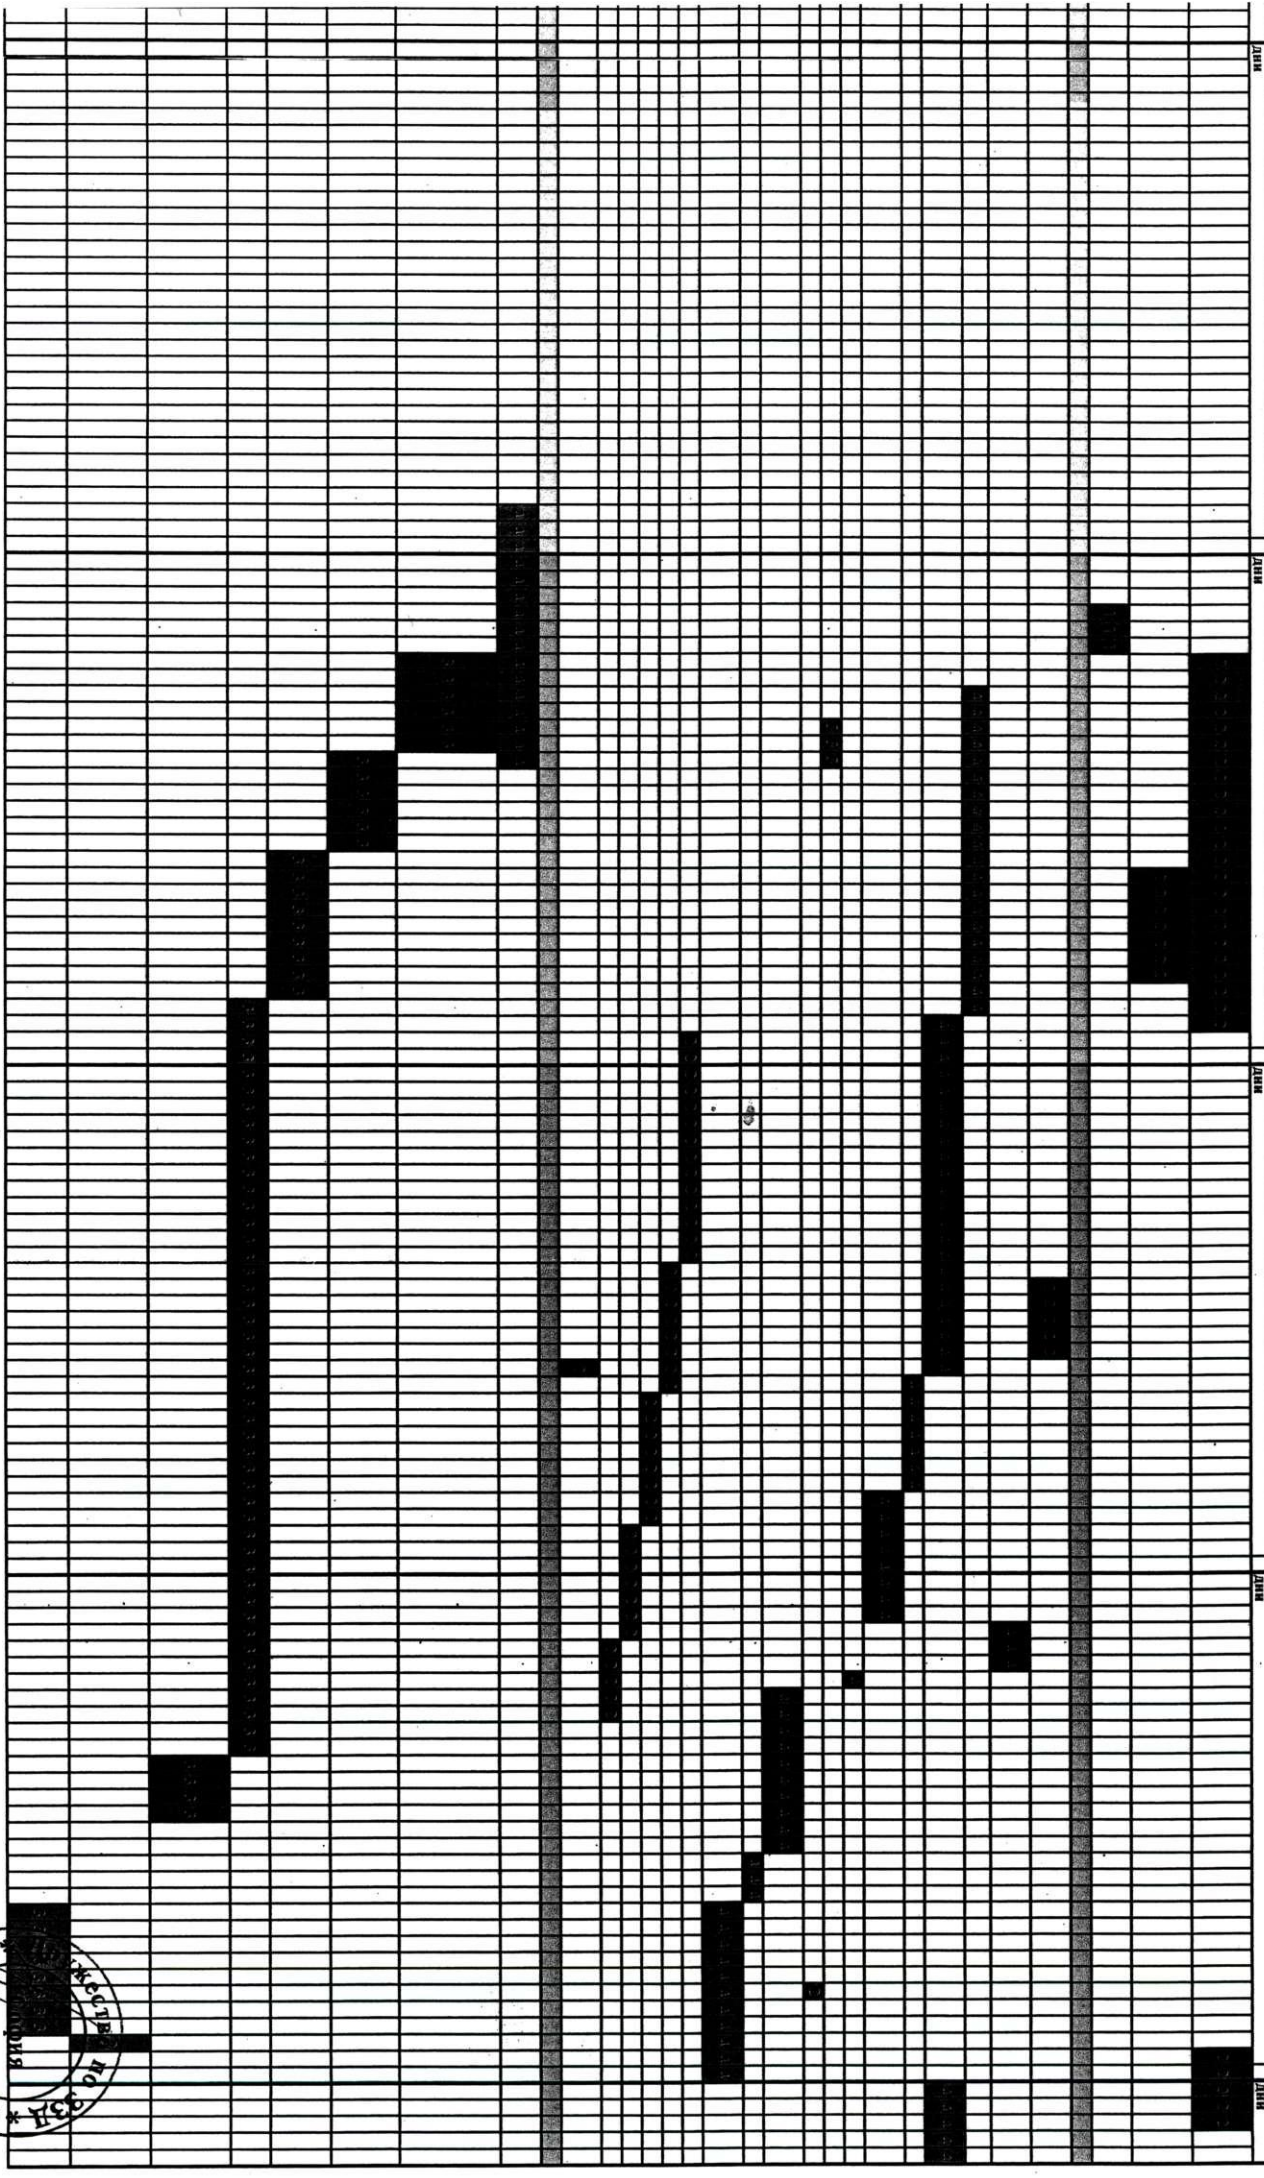

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

00000 0



№ по ред	Наименование на дейността	брой заети работници	Календарни дни			Месец 1	Месец 2	Месец 3
			Начало	Край	дни			
1	Изграждане на самуителна вентилация на домякински културен съоръжение (лъчи или котлони) в културното боксове (апаратори), включително всички съоръжения СМР	3	1. 200-та	200-та	1			
9	Изграждане на система за охлаждане със сонит система канализатори, включително всички съоръжения СМР	3	4. 201-ми	205-ти	1			
10	Изграждане на спортни отпадъци,	1	3. 126-ти	136-ти	1			
11	Изграждане на спортни отпадъци,	1	3. 126-ти	136-ти	1			
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ПО ДНИ								
1	Извършване на единични, комплексни и 72-часови капитализации:	2	6. 210-ти	217-ти	1			
2	Изготвяне на евентуална документация, съгласно чл. 173 от ЗУТ	2	10. 198-ми	207-ми	1			
3	Качествено заснемане на строежа и получаване на удостоверение по чл. 52, ал.5 от ЗКНП.	2	3. 195-ти	197-ми	1			
4	Участие във всички дейности по прилагане на строежа и възвеждане в експлоатация.	2	5. 216-ти	220-ти	1			
					1	5		
					2	5		
					3	5		
					4	5		
					5	5		
					6	5		
					7	5		
					8	5		
					9	5		
					10	5		
					11	5		
					12	5		
					13	5		
					14	5		
					15	5		
					16	2		
					17	2		
					18	2		
					19	2		
					20	2		
					21	2		
					22	2		
					23	2		
					24	2		
					25	2		
					26	2		
					27	2		
					28	2		
					29	2		
					30	2		
					31	5		
					32	5		
					33	5		
					34	5		
					35	5		
					36	5		
					37	5		
					38	5		
					39	5		
					40	5		
					41	5		
					42	5		
					43	5		
					44	5		
					45	5		
					46	5		
					47	5		
					48	5		
					49	5		
					50	5		
					51	5		
					52	5		
					53	5		
					54	5		
					55	5		
					56	8		
					57	8		
					58	8		
					59	8		
					60	8		
					61	8		
					62	8		
					63	8		
					64	8		
					65	8		
					66	8		
					67	8		
					68	8		
					69	8		
					70	8		
					71	6		
					72	6		
					73	6		
					74	6		
					75	6		
					76	6		
					77	6		
					78	6		
					79	6		
					80	6		
					81	9		
					82	9		
					83	9		
					84	9		
					85	9		


Забелешка 1: Формата на таблицата да се допълни с дни и месеци, в зависимост от предходната от уместната форма 2. След изготвяне на ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТ във фаза "Работен проект", извърши за ИЗПЪЛНЕНИЕ на поръчката, ще предостави подробен дневен график за изпълнение на СМР и

Дата на подписване: 03.06.2015 г.
 Име и фамилия: Димитър Хрусефов
 Подпис на лицето (в печат):

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Диаграма на работната ръка

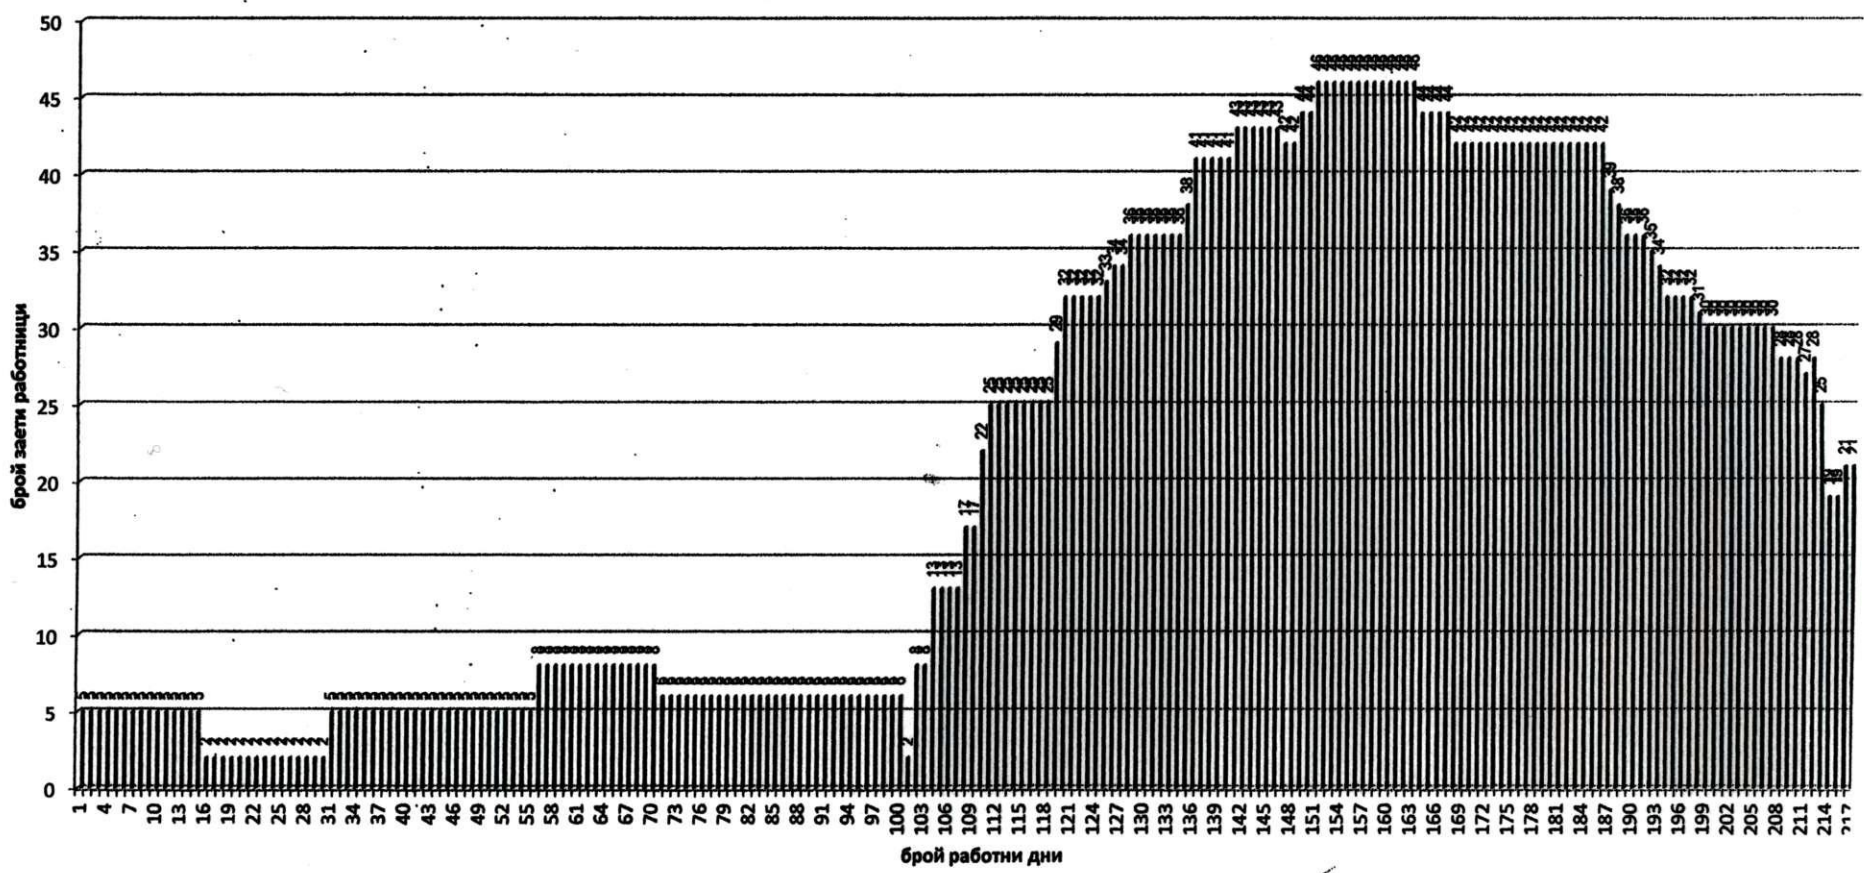

[Handwritten signature]



000000
