


ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Долуподписаният/та Димчо Жеков Тилев,

В качеството ми на управител (посочва се длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява) на „Тилев архитекти“ ЕООД (посочва се наименованието на участника), с ЕИК 130977960, със седалище и адрес на управление: гр. София 1527 район р-н Оборище Стара планина No 31-33, ет. 2, ап. Офис 3-4 – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА „ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ“ И ФАЗА „РАБОТЕН ПРОЕКТ“ , НЕПРЕДВИДЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ИЗГОТВЯНЕ НА ПОДРОБНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ НА ОСНОВА ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРИТ АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС И ПРЕДСТАВЕНИЯТ КОНКУРСЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: Учебно-административна сграда и Ректорат на Медицински университет - София и прилежащите - Деканат на Медицински факултет към МУ - София, Факултет по обществено здраве към МУ - София, конгресен център и подземен гараж, С ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ, ВЪВ ВСИЧКИ ТЕХНИ ЧАСТИ, ЕТАПИ И ФАЗИ, ДО СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СТРОЕЖ И ГОТОВНОСТ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР В УПИ 1 - ЗА БОЛНИЧЕН КОМПЛЕКС, КВ. 387, М. „БУЛ. БЪЛГАРИЯ-МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС-МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ“.**


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕКТОР,

След като се запознах с условията по процедурата по договаряне без предварително обявление по обществена поръчка с предмет: „ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН



ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА „ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ“ И ФАЗА „РАБОТЕН ПРОЕКТ“ , НЕПРЕДВИДЕНО ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ИЗГОТВЯНЕ НА ПОДРОБНИ КОЛИЧЕСТВЕНИ СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ НА ОСНОВА ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРИТ АРХИТЕКТУРЕН КОНКУРС И ПРЕДСТАВЕНИЯТ КОНКУРСЕН ПРОЕКТ ЗА ОБЕКТ: Учебно-административна сграда и Ректорат на Медицински университет - София и прилежащите - Деканат на Медицински факултет към МУ - София, Факултет по обществено здраве към МУ - София, конгресен център и подземен гараж, С ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ, ВЪВ ВСИЧКИ ТЕХНИ ЧАСТИ, ЕТАПИ И ФАЗИ, ДО СТЕПЕН НА ЗАВЪРШЕНОСТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА СТРОЕЖ И ГОТОВНОСТ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР В УПИ 1 - ЗА БОЛНИЧЕН КОМПЛЕКС, КВ. 387, М. „БУЛ. БЪЛГАРИЯ-МЕДИЦИНСКИ КОМПЛЕКС-МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ“ - заявяваме, че сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.


1. Приемаме да изпълняваме поръчката съгласно всички изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие по настоящата обществена поръчка в пълен обем на описаните дейности в Техническата спецификация и съгласно отделните договори, предложени от Възложителя.
2. В нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.
3. Срок за изпълнение на отделните услуги от поръчката са, както следва:
 - Срокът за изготвяне на инвестиционния проект във фаза „Технически проект“ съгласно техническите спецификации, включително оптимизация на идейния проект, на Възложителя и направеното от Изпълнителя предложение и предаването му на Възложителя е до 390 (триста и деветдесет) календарни дни, считано от датата на влизане на договора в сила.
 - Срокът за изготвяне на подробни количествени стойностни сметки на инвестиционен проект във фаза „Технически проект“ съгласно техническите спецификации на Възложителя и направеното от Изпълнителя предложение и предаването му на Възложителя е до 60 (шестдесет) календарни дни, считано от датата на влизане на договора в сила.
 - Срокът за изготвяне на инвестиционния проект във фаза „Работен проект“ съгласно техническите спецификации на Възложителя е по време на изпълнение на



строителството и започва да тече от датата на подписване на Акт образец № 2 за откриване на строителната площадка до окончателното завършване на строежа.

- Срокът за упражняване на авторски надзор по време на строителството тече от датата на подписване на Акт образец № 2 за откриване на строителната площадка до окончателното завършване на строежа, включително реализиране на част „ИнтерIOR, визуална комуникация и обзавеждане“ - с подписването на необходимите и установени от закона документи за неговото приключване.

Важно! Ако е приложимо, към настоящото техническо предложение се прилага декларация (свободна форма) относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване възложителят да не я разкрива.



Подпис и печат, ако има такъв:

Дата: 26.06.2020г.

Име и фамилия Андрей Тинев

Длъжност: управител


Наименование на участника: Тинев Архитект

ЕООД

Декларация За конфиденциален характер на част от офертата

Аз, долуподписания Димчо Жеков Тилев, ЕГН 7512209087, в качеството си на управител на Тилев Архитекти ЕООД, Булстат 130977960, ИН по ЗДДС BG130977960, адрес гр.София, ул. Стара планина №31-33, ет.2 офис 3-4, декларирам, че частите от нашата оферта, които съдържат информация за разпределянето на цената по фазите и частите на проекта имат конфиденциален характер и молим Възложителя да не разкрива тази информация, освен в предвидените от закона случаи.

Подпис и печат



Дата:

Име и фамилия


Длъжност:

Наименование на участника:


Тилев Архитекти ЕООД

ТАБЛИЦА СЪС СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СРОКОВЕТЕ ПО ЧАСТИ И ФАЗИ


№	Проектиране по фази и части	СРОК в календарни дни
ФАЗА: ОПТИМИЗАЦИЯ НА ИДЕЙНИЯ ПРОЕКТ		
1.	Част: Архитектура	150
2.	Част: Конструкции	150
3.	Част: ТОВК	150
4.	Част: Електрически инсталации и Външни връзки	150
5.	Част: ВиК и Външни ВиК връзки	150
6.	Част: Енергийна ефективност	90
7.	Част: Пожарна безопасност	150
8.	Част: Паркоустройство и благоустройство	120
	ОБЩО :	150
	ЗАБЕЛЕЖКА: Специалностите с по-кратък срок от 150 календарни дни започват работа по-късно, но завършват работа заедно с всички останали	
ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ		
1.	Част: Архитектура	240
2.	Част: Архитектурна акустика	240
3.	Част: Интериор, визуална комуникация и обзавеждане	240
4.	Част: Конструкции	240
5.	Част: Водоснабдяване и канализация	240
6.	Част: Електрически инсталации	240
7.	Част: ТОВК	240
8.	Част: Технологична	240
9.	Част: Асансьорни уредби	150
10.	Част: Енергийна ефективност	160
11.	Част :Вертикална планировка	210
12.	Част: Паркоустройство и благоустройство	210
13.	Част: Геодезия	210
14.	Част: Пътна	120
15.	Част: План за управление на отпадъците	120
16.	Част: Пожарна безопасност	240
17.	Част: ПБЗ	90
18.	Част: Детайли и координация по всички специалности	240
	ОБЩО :	240
	ЗАБЕЛЕЖКА: Специалностите с по-кратък срок от 240 календарни дни започват работа по-късно, но завършват работа заедно с всички останали	

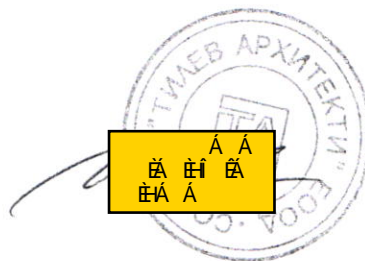

ИЗГОТВЯНЕ НА ПОДРОБНИ КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ		
1.	Част: Архитектура	60
2.	Част: Архитектурна акустика	60
3.	Част: Интериор, визуална комуникация и обзавеждане	60
4.	Част: Конструкции	60
5.	Част: Водоснабдяване и канализация	60
6.	Част: Електрически инсталации	60
7.	Част: ТОВК	60
8.	Част: Технологична	60
9.	Част: Асансьорни уредби	60
10.	Част: Енергийна ефективност	60
11.	Част :Вертикална планировка	60
12.	Част: Паркоустройство и благоустройство	60
13.	Част: Геодезия	60
14.	Част: Пътна	60
15.	Част: План за управление на отпадъците	60
16.	Част: Пожарна безопасност	60
17.	Част: ПБЗ	60
18.	Част: Детайли и координация по всички специалности	60
		ОБЩО : 60
ФАЗА: РАБОТЕН ПРОЕКТ		
1.	Част: Архитектура	през цялото време на строителството
2.	Част: Архитектурна акустика	през цялото време на строителството
3.	Част: Интериор, визуална комуникация и обзавеждане	през цялото време на строителството
4.	Част: Конструкции	през цялото време на строителството
5.	Част: Водоснабдяване и канализация	през цялото време на строителството
6.	Част: Електрически инсталации	през цялото време на строителството
7.	Част: ТОВК	през цялото време на строителството
8.	Част: Технологична	през цялото време на строителството
9.	Част: Асансьорни уредби	през цялото

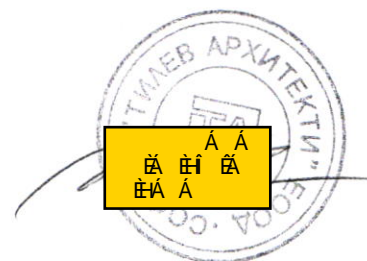

		време на строителството
10.	Част: Енергийна ефективност	през цялото време на строителството
11.	Част :Вертикална планировка	през цялото време на строителството
12.	Част: Паркоустройство и благоустройство	през цялото време на строителството
13.	Част: Геодезия	през цялото време на строителството
14.	Част: Пътна	през цялото време на строителството
15.	Част: План за управление на отпадъците	през цялото време на строителството
16.	Част: Пожарна безопасност	през цялото време на строителството
17.	Част: ПБЗ	през цялото време на строителството
18.	Част: Детайли и координация по всички специалности	през цялото време на строителството
	ОБЩО :	през цялото време на строителството
ФАЗА: АВТОРСКИ НАДЗОР		
1.	Част: Архитектура	през цялото време на строителството
2.	Част: Архитектурна акустика	през цялото време на строителството
3.	Част: Интериор, визуална комуникация и обзавеждане	през цялото време на строителството
4.	Част: Конструкции	през цялото време на строителството
5.	Част: Водоснабдяване и канализация	през цялото време на строителството
6.	Част: Електрически инсталации	през цялото

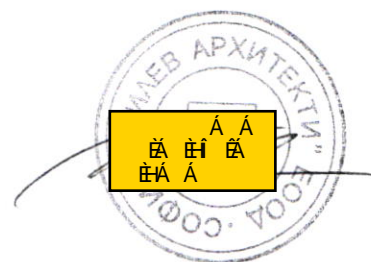


		време на строителството
7.	Част: ТОВК	през цялото време на строителството
8.	Част: Технологична	през цялото време на строителството
9.	Част: Асансьорни уредби	през цялото време на строителството
10.	Част: Енергийна ефективност	през цялото време на строителството
11.	Част :Вертикална планировка	през цялото време на строителството
12.	Част: Паркоустройство и благоустройство	през цялото време на строителството
13.	Част: Геодезия	през цялото време на строителството
14.	Част: Пътна	през цялото време на строителството
15.	Част: План за управление на отпадъците	през цялото време на строителството
16.	Част: Пожарна безопасност	през цялото време на строителството
17.	Част: ПБЗ	през цялото време на строителството
18.	Част: Детайли и координация по всички специалности	през цялото време на строителството
	ОБЩО :	през цялото време на строителството

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Предложените срокове по фази „Оптимизация на идейния проект“, „Технически проект“ и „Изготвяне на подробни количествено-стойностни сметки“ са максималните срокове. В случай, че в процеса на работа се установи, че тези фази могат да се завършат по-рано, то те ще бъдат предадени в по-кратки срокове от предложените.

2. Посоченият срок „през цялото време на строителството“ за фаза „Работен проект“ обхваща периода от датата на подписване на Акт образец № 2 за откриване на строителната площадка до окончателното завършване на строежа.



3. Посоченият срок „през цялото време на строителството“ за фаза „Авторски надзор“ обхваща периода от датата на подписване на Акт образец № 2 за откриване на строителната площадка до окончателното завършване на строежа, включително реализиране на част „Интериор, визуална комуникация и обзавеждане“ - с подписването на необходимите и установени от закона документи за неговото приключване.

Подпис и печат:
Дата: 26.06.2022г.
Име и фамилия: *Винчо Тушев*
Длъжност: *Управляващ*
Наименование на участника:
Тушев Архитект ЕООД

